Budapest, Bank Center,

mélygarázs padlózatának javítása

PROBLÉMA:

A Budapest, Bank Center szolgáltató háznál, a mélygarázsok aljzaton különböző repedések keletkeztek.

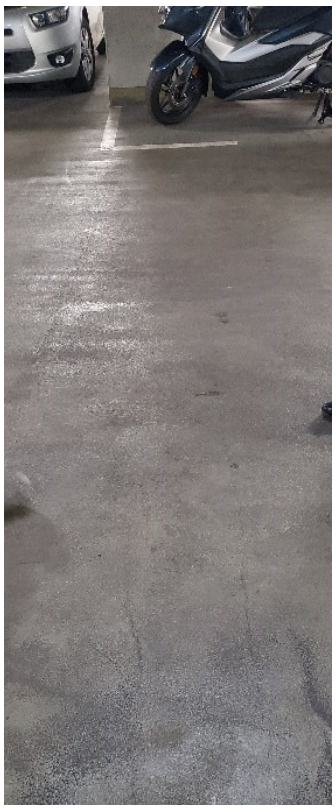

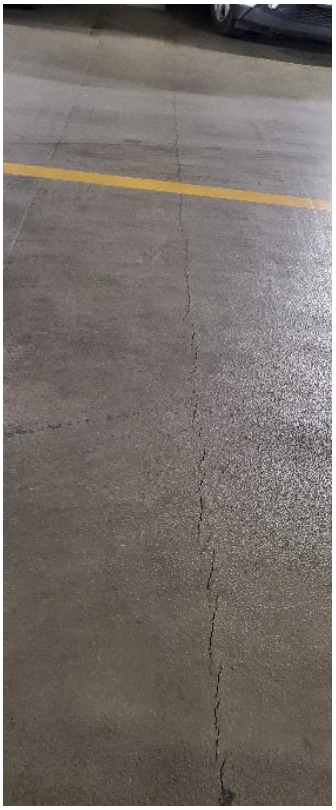

A MEGOLDÁS:

A repedéseket és egyéb hibás felületetek szélei meg lettek vágva, ki lettek takarítva.

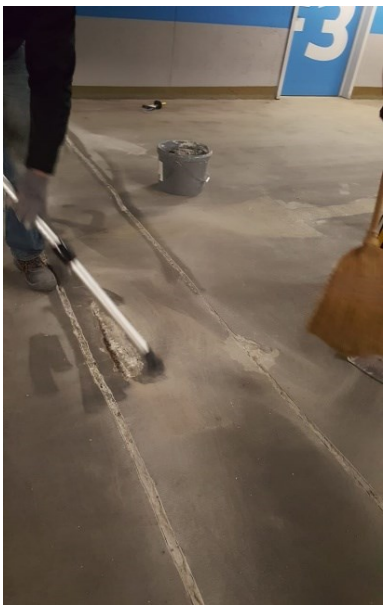

A kilátszó betonacálok ENESEAL® CR anyaggal, a teljes betonfelület CHEMCLAD® P4C tapadóhíddal lett kezelve.

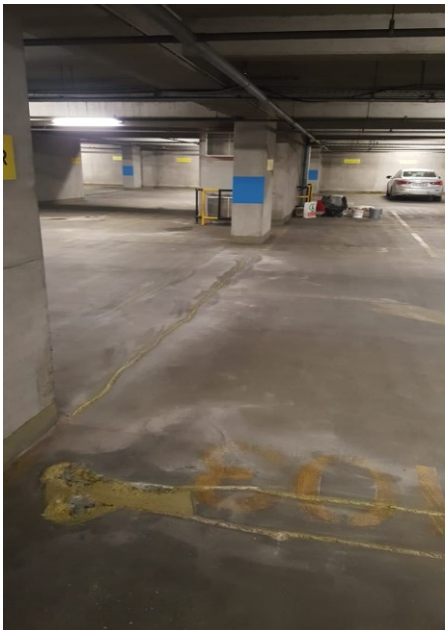

A megvágott vékony résekbe FLEXICLAD® LC rugalmas anyag került.

Ezután került sor a maradék helyek kiöntésére DURAFILL® anyaggal. A felület vékony homok réteget kapott a tapadás érdekében.

Megrendelő kérésére egy kopásmentes út irány jelző is fel lett újítva ENESEAL CR “sárga” és DuraFill anyagok felhasználásával.

Szilárdulás után a homok réteg eltávolításra került, majd a szükséges helyeken a jelöléseket pótoltuk, ezt követően a terület vissza lett adva a forgalomnak.

Megrendelő megelégedettségére, kevés zajjal, kosszal, hamar elkészült a feladat.

Felhasznált anyagok:

- ENESEAL® CR
- DURAFILL®
- FLEXICLAD® LC
- CHEMCLAD® P4C
- SPECIÁLIS HOMOK

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselet.

2021 Budapest,
